

**PROJEKT IZRADIO:**

PRE – CON d.o.o.  
42 000 VARAŽDIN, Hrv. branitelja 7  
OIB: 51808332482  
Tel/Fax: 042/206-237, GSM: 098/9073-234  
e-mail: blazenko.premuzic@vz.t-com.hr

**NAZIV:**

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA  
ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 2085 U IVANCU,  
PRILIKOM IZGRADNJE GRAĐEVINE SUSTAVA  
PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH  
VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE IVANEC  
**MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA S  
PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA  
IVANEC (DIONICA: DIO NASELJA IVANEC,  
KOLEKTOR K-III - Ulica V. Nazora)**

**INVESTITOR:**

IVKOM – VODE d.o.o.  
V. NAZORA 96B  
42240 IVANEC  
OIB: 91920869215

**NAZIV PROJEKTA:**

PROMETNI ELABORAT

**Ozn. proj.:** EL-51-7/21

Varaždin, siječanj 2024.

**Projektant :**

Blaženko Premužić dipl.inž.građ.  
ovlaštenu inženjer građevinarstva

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Blaženko Premužić  
dipl. inž. građ.  
Ovlaštenu inženjer građevinarstva  
  
G 4108

**Direktor:**

Blaženko Premužić dipl.inž.građ.

  
**PRECON** d.o.o.  
Varaždin, Ul. hrvatskih branitelja 7

PROJEKT IZRADIO: PRE – CON d.o.o. VARAŽDIN, Hrv. branitelj 7	Naziv: PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 2085 U IVANCU, PRILIKOM IZGRADNJE MJEŠOVITE KAN. MREŽE S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC (KOLEKTOR K-III)		Investitor: IVKOM - VODE d.o.o.		
	Projektant: B.PREMUŽIĆ, dipl. ing. građ.	Projekt: PROMETNI ELABORAT	Datum: 01.2024.	Oz .proj.: EL-51-7/21	List: 1

## SADRŽAJ

### 1.0.0. OPĆI DIO

- Rješenje o imenovanju projektanta
- Izjava sukladnosti

### 2.0.0. TEKSTUALNI DIO

- Tehnički opis
- Iskaz prometnih znakova
- Prikaz tehničkih mjera za osiguranje tehničkih svojstava građevine
- Prikaz primjenjenih mjera zaštite na radu
- Prikaz primjenjenih mjera zaštite od požara

### 3.0.0. GRAFIČKI DIO

- Pregledna situacija, MJ 1:25000 3.01.
- Shematski prikaz priv. prometne signalizacije na ŽC 2085, 3.02.

PROJEKT IZRADIO: PRE – CON d.o.o. VARAŽDIN, Hrv. branitelj 7	Naziv: PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 2085 U IVANCU, PRILIKOM IZGRADNJE MJEŠOVITE KAN. MREŽE S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC (KOLEKTOR K-III)		Investitor: IVKOM - VODE d.o.o.		
	Projektant: B.PREMUŽIĆ, dipl. ing. građ.	Projekt: PROMETNI ELABORAT	Datum: 01.2024.	Oz .proj.: EL-51-7/21	List: 2

## 1.0.0. OPĆI DIO

PROJEKT IZRADIO: PRE – CON d.o.o. VARAŽDIN, Hrv. branitelja 7	Naziv: PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 2085 U IVANCU, PRILIKOM IZGRADNJE MJEŠOVITE KAN. MREŽE S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC (KOLEKTOR K-III)		Investitor: IVKOM - VODE d.o.o.		
	Projektant: B.PREMUŽIĆ, dipl. ing. građ.	Projekt: PROMETNI ELABORAT	Datum: 01.2024.	Oz .proj.: EL-51-7/21	List: 3

Temeljem članka 51. "Zakona o gradnji" (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosim

## RJEŠENJE o imenovanju projektanta

imenuje se:

**BLAŽENKO PREMUŽIĆ, dipl.inž.građ.**

broj rješenja upisa u komoru: klasa: UP/I-360-01/08-01/4108  
upisan u **Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva** pod rednim brojem 4108

za građevinu : PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA ŽUPANIJSKOJ  
CESTI ŽC 2085 U IVANCU, PRILIKOM IZGRADNJE  
GRAĐEVINE SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE  
OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE IVANEC  
**MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA S PODRUČJA  
CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC (DIONICA: DIO  
NASELJA IVANEC, KOLEKTOR K-III - Ulica V. Nazora)**

čiji je investitor : IVKOM - VODE d.o.o.  
Vladimira Nazora 96B, 42240 Ivanec

lokacija : k.o. IVANEC

broj projekta : EL-51-7/21

Imenovana osoba udovoljava odredbama Zakona o gradnji i nosi naziv "ovlaštenu inženjer". Ovo rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili do opoziva.

Varaždin, siječanj 2024.  
Broj: 51-7/2021.

**Za PRE – CON d.o.o. Varaždin**  
direktor:  
Blaženko Premužić

  
**PRE-CON** d.o.o.  
Varaždin, Ul. hrvatskih branitelja 7

PROJEKT IZRADIO: PRE – CON d.o.o. VARAŽDIN, Hrv. branitelj 7	Naziv: PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 2085 U IVANCU, PRILIKOM IZGRADNJE MJEŠOVITE KAN. MREŽE S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC (KOLEKTOR K-III)		Investitor: IVKOM - VODE d.o.o.		
	Projektant: B.PREMUŽIĆ, dipl. ing. građ.	Projekt: PROMETNI ELABORAT	Datum: 01.2024.	Oz .proj.: EL-51-7/21	List: 4

Na temelju članka 70. Zakona o gradnji ( N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 )

za građevinu : PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 2085 U IVANCU, PRILIKOM IZGRADNJE GRAĐEVINE SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA AGLOMERACIJE IVANEC **MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC (DIONICA: DIO NASELJA IVANEC, KOLEKTOR K-III - Ulica V. Nazora)**

čiji je naručitelj : IVKOM - VODE d.o.o.  
Vladimira Nazora 96B, 42240 Ivanec

broj projekta : EL-51-7/21

dajem:

## IZJAVU SUKLADNOSTI

da je ovaj projekt sukladan sa sljedećim zakonima, propisima i normama:

- Zakon o prostornom uređenju, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23
- Zakon o gradnji, 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
- Zakon o zaštiti na radu, NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18
- Zakon o zaštiti prirode, NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19
- Zakon o vodama, NN 66/19
- Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10
- Zakon o normizaciji NN 80/13
- Zakon o cestama, NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19
- Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama, NN 64/16
- Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste, NN 140/13
- Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko tehničkim uvjetima i normama za sprečavanje arhitektonsko urbanističkih barijera, NN 47/82, 151/05, 61/07
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, 92/19
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu, NN 95/14
- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama, NN 92/19
- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste i njihovi elementi moraju udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa, NN 110/01
- Pravilnik o hrvatskim normama NN RH br. 22/96
- Norme za horizontalnu signalizaciju, HRN U.S4.221-234
- Norme za vertikalnu signalizaciju, HRN Z.S2.301.330
- Norme za kvalitetu tankostijenih oznaka na kolniku, HRN Z.S2.240

Varaždin, siječanj 2024.  
Broj: 51-7/2021.

Projektant:  
Blaženko Premužić dipl.ing.građ.



PROJEKT IZRADIO: PRE – CON d.o.o. VARAŽDIN, Hrv. branitelj 7	Naziv: PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 2085 U IVANCU, PRILIKOM IZGRADNJE MJEŠOVITE KAN. MREŽE S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC (KOLEKTOR K-III)		Investitor: IVKOM - VODE d.o.o.		
	Projektant: B.PREMUŽIĆ, dipl. ing. građ.	Projekt: PROMETNI ELABORAT	Datum: 01.2024.	Oz .proj.: EL-51-7/21	List: 5

## 2.0.0. TEKSTUALNI DIO

PROJEKT IZRADIO: PRE – CON d.o.o. VARAŽDIN, Hrv. branitelj 7	Naziv: PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 2085 U IVANCU, PRILIKOM IZGRADNJE MJEŠOVITE KAN. MREŽE S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC (KOLEKTOR K-III)		Investitor: IVKOM - VODE d.o.o.		
	Projektant: B.PREMUŽIĆ, dipl. ing. građ.	Projekt: PROMETNI ELABORAT	Datum: 01.2024.	Oz .proj.: EL-51-7/21	List: 6

## TEHNIČKI OPIS

### Općenito

Predmet ovog elaborata je postavljanje privremene regulacije prometa na županijskoj cesti ŽC 2085 u Ivanču, prilikom izgradnje građevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Ivanec, mješovita kanalizacijska mreža s područja centralnog dijela naselja Ivanec (Dionica: dio naselja Ivanec, Kolektor K-III u Ulici Vladimira Nazora).

### Postojeća vertikalna prometna signalizacija

Na predmetnoj lokaciji prometnice gdje se izvode radovi nema postojeće vertikalne prometne signalizacije koja bi bila u koliziji sa privremenom.

### Projektirana vertikalna prometna signalizacija

Nova privremena vertikalna prometna signalizacija postavlja se zbog izvođenja radova na županijskoj cesti ŽC 2085 u naselju Ivanec, prilikom izgradnje građevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Ivanec, mješovita kanalizacijska mreža s područja centralnog dijela naselja Ivanec (Dionica: dio naselja Ivanec, Kolektor K-III u Ulici Vladimira Nazora).

Nova privremena vertikalna prometna signalizacija postavlja se zbog smještaja potrebnih strojeva, materijala i opreme.

Potrebno je postaviti prometnu signalizaciju i osigurati naizmjenično propuštanje vozila pomoću mobilnih semafora. Paralelno sa pomicanjem radova, pomiče se i pozicija mobilnih semafora. Istovremeno je pod signalizacijom dionica u dužini od oko 100 m.

U slučaju potrebe, izvođač radova će ručnom regulacijom dodatno osigurati sigurno odvijanje prometa.

Vertikalnu prometnu signalizaciju potrebno je izvesti prema situacijskim prikazima danim u sklopu grafičkih priloga, te u skladu s priloženim iskazom znakova.

Vertikalna prometna signalizacija mora biti najmanje klase II retrorefleksije. Pri postavljanju više prometnih znakova na jedan stup (npr. A14 i B31) isti moraju biti istog reda retrorefleksije (najmanje II reda).

### Horizontalna signalizacija

Ne predviđa se izrada privremenih horizontalnih oznaka.

PROJEKT IZRADIO: PRE – CON d.o.o. VARAŽDIN, Hrv. branitelj 7	Naziv: PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 2085 U IVANCU, PRILIKOM IZGRADNJE MJEŠOVITE KAN. MREŽE S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC (KOLEKTOR K-III)		Investitor: IVKOM - VODE d.o.o.		
	Projektant: B.PREMUŽIĆ, dipl. ing. građ.	Projekt: PROMETNI ELABORAT	Datum: 01.2024.	Oz .proj.: EL-51-7/21	List: 7

Pri izradi ovog prometnog elaborata korišteni su slijedeći zakoni, pravilnici i propisi:

- Zakon o prostornom uređenju, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23
- Zakon o gradnji, 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19
- Zakon o cestama, NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19
- Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama, NN 64/16
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, NN 92/19
- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama, NN 92/19
- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste i njihovi elementi moraju udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa, NN 110/01
- Norme za horizontalnu signalizaciju, HRN U.S4.221-234
- Norme za vertikalnu signalizaciju, HRN Z.S2.301.330
- Norme za kvalitetu tankostijenih oznaka na kolniku, HRN Z.S2.240

U Varaždinu, siječanj 2024.







Projektant:  
Blaženko Premužić, dipl.ing.građ.





PROJEKT IZRADIO: PRE – CON d.o.o. VARAŽDIN, Hrv. branitelja 7	Naziv: PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 2085 U IVANCU, PRILIKOM IZGRADNJE MJEŠOVITE KAN. MREŽE S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC (KOLEKTOR K-III)		Investitor: IVKOM - VODE d.o.o.		
	Projektant: B.PREMUŽIĆ, dipl. ing. građ.	Projekt: PROMETNI ELABORAT	Datum: 01.2024.	Oz .proj.: EL-51-7/21	List: 8

## ISKAZ ZNAKOVA

PROMETNI ZNAK	OZNAKA ZNAKA	DIMENZIJE ZNAKA	POLOŽAJ ZNAKA	KOMADA
	A15+G17	90x90x90	PREMA SITUACIJI	2
	A14	90x90x90	PREMA SITUACIJI	2
	E01	60x30	PREMA SITUACIJI	2
	E01	60x30	PREMA SITUACIJI	2
MOBILNI SEMAFOR			PREMA SITUACIJI	2
	K13		PREMA SITUACIJI	16
	K15, K15-1		PREMA SITUACIJI	8

Prometni znakovi moraju biti izrađeni i postavljeni u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19), te Pravilnikom o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama, (NN 92/19).

U Varaždinu, siječanj 2024.

Projektant:  
Blaženko Premužić, dipl.ing.građ.

PROJEKT IZRADIO: PRE – CON d.o.o. VARAŽDIN, Hrv. branitelj 7	Naziv: PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 2085 U IVANCU, PRILIKOM IZGRADNJE MJEŠOVITE KAN. MREŽE S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC (KOLEKTOR K-III)	Investitor: IVKOM - VODE d.o.o.		
	Projektant: B.PREMUŽIĆ, dipl. ing. građ.	Projekt: PROMETNI ELABORAT	Datum: 01.2024.	Oz .proj.: EL-51-7/21

## PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZA OSIGURANJE TEHNIČKIH SVOJSTAVA GRAĐEVINE

### Oblik i veličina prometnih znakova

Data je u iskazu pojedinih znakova.

### Postavljanje prometnih znakova

Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste pored kolnika, u smjeru kretanja vozila prema slijedećem:

- izvan naselja na visini od 1,2-1,5 m
- u naseljima se znakovi pored kolnika postavljaju na visini od 0,3-2,2 m
- u naseljima se znakovi iznad kolnika postavljaju na visini od 4,50 m, a iznimno i na većoj

Visina znaka računa se od površine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka, a ako se isti postavlja s dopunskom pločom, visina se računa do donjeg ruba dopunske ploče.

Prometni znakovi postavljaju se na stupove kružnog presjeka, promjera 80-100 mm. Horizontalni razmak između ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka mora biti najmanje 0,30 m. Mjesto gdje se postavljaju prometni znakovi označeno je na situaciji u projektu i u iskazu znakova.

U Varaždinu, siječanj 2024.

Projektant:  
Blaženko Premužić, dipl.ing.građ.



PROJEKT IZRADIO: PRE – CON d.o.o. VARAŽDIN, Hrv. branitelj 7	Naziv: PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 2085 U IVANCU, PRILIKOM IZGRADNJE MJEŠOVITE KAN. MREŽE S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC (KOLEKTOR K-III)	Investitor: IVKOM - VODE d.o.o.		
	Projektant: B.PREMUŽIĆ, dipl. ing. građ.	Projekt: PROMETNI ELABORAT	Datum: 01.2024.	Oz .proj.: EL-51-7/21

## PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU MJERA ZAŠTITE NA RADU

Tijekom postavljanja prometne signalizacije potrebno se pridržavati važeće zakonske regulative s područja zaštite na radu, kojom se regulira slijedeće:

- organizacija i uređenje radilišta
- organizacija prostora za skladištenje svih potrebnih materijala
- organizacija transporta materijala, alata, strojeva i ljudi
- osiguranje ispravnosti sredstava za rad (alati i strojevi)
- ispravnost i pravilna upotreba osobnih zaštitnih sredstava (radna odijela, zaštitne rukavice, cipele, kacige i dr.)
- organizacija pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika
- sanacija okolinje i dovođenje radilišta u stanje prije izgradnje

Kontrolu provedbe opisanih mjera zaštite na radu provode izvođač radova, nadzorni inženjer i ovlaštene predstavnici nadležnih državnih tijela za poslove inspekcije rada.

Navedene mjere obuhvaćaju svu opremu i radove koji se prema Zakonu o zaštiti na radu moraju provesti za ovu vrstu radova. Oprema izvođača, osiguranje ispravnosti strojeva, alata i radnika mora u potpunosti odgovarati propisima tehničke zaštite.

Prilikom odvijanja radova cestovni promet će se na predmetnoj dionici odvijati uz ograničenja, a izvođač radova dužan je postaviti odgovarajuću privremenu prometnu signalizaciju.

Strojevi, vozila i radnici moraju biti obilježeni odgovarajućim znakovima i oznakama s reflektirajućim svojstvima.

U Varaždinu, siječanj 2024.

Projektant:  
Blaženko Premužić, dipl.ing.građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA  
Blaženko Premužić  
dipl. ing. građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 4108

PROJEKT IZRADIO: PRE – CON d.o.o. VARAŽDIN, Hrv. branitelj 7	Naziv: PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 2085 U IVANCU, PRILIKOM IZGRADNJE MJEŠOVITE KAN. MREŽE S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC (KOLEKTOR K-III)	Investitor: IVKOM - VODE d.o.o.		
	Projektant: B.PREMUŽIĆ, dipl. ing. građ.	Projekt: PROMETNI ELABORAT	Datum: 01.2024.	Oz .proj.: EL-51-7/21

## PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Za vrijeme izvedbe prometna signalizacije potrebno je provesti sve propisane mjere prema važećoj zakonskoj regulativi s područja zaštite od požara, te zaštite na radu i rukovanju s lakozapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar. Takve je materijale potrebno držati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena kako ne bi došlo do zapaljenja i požara.

Lako zapaljive materijale (benzin, nafta, ulja, boje i razrjeđivači) potrebno je čuvati u posebnim skladišnim prostorima, osiguranim od požara prema važećim propisima, zakonima i normama.

Električni uređaji, instalacije i oprema moraju kvalitetom i načinom izvedbe odgovarati važećim propisima i standardima.

Kontrolu provođenja opisanih mjera zaštite od požara vrši izvođač radova, nadzorni inženjer i ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela.

Za vrijeme izrade prometne signalizacije potrebno se pridržavati svih uputa i sigurnosnih mjera za lakozapaljive materijale koji mogu izazvati požar (boje, lakovi i plastične folije). Pri radu s ovim materijalima zabranjena je upotreba otvorenog plamena i potrebno ih je držati na sigurnoj udaljenosti od izvora topline.

Na svim mjestima gdje postoji opasnost od požara potrebno se pridržavati propisanih mjera zaštite prema Zakonu o zaštiti od požara.

Nakon završetka radova potrebno je urediti radilište i ukloniti sve ostatke materijala, a okoliš dovesti u prvobitno stanje.


U Varaždinu, siječanj 2024.

Projektant:  
Blaženko Premužić, dipl.ing.građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA  
Blaženko Premužić  
dipl. ing. građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 4108

PROJEKT IZRADIO: PRE – CON d.o.o. VARAŽDIN, Hrv. branitelj 7	Naziv: PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 2085 U IVANCU, PRILIKOM IZGRADNJE MJEŠOVITE KAN. MREŽE S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC (KOLEKTOR K-III)		Investitor: IVKOM - VODE d.o.o.		
	Projektant: B.PREMUŽIĆ, dipl. ing. građ.	Projekt: PROMETNI ELABORAT	Datum: 01.2024.	Oz .proj.: EL-51-7/21	List: 12

## 3.0.0. GRAFIČKI DIO

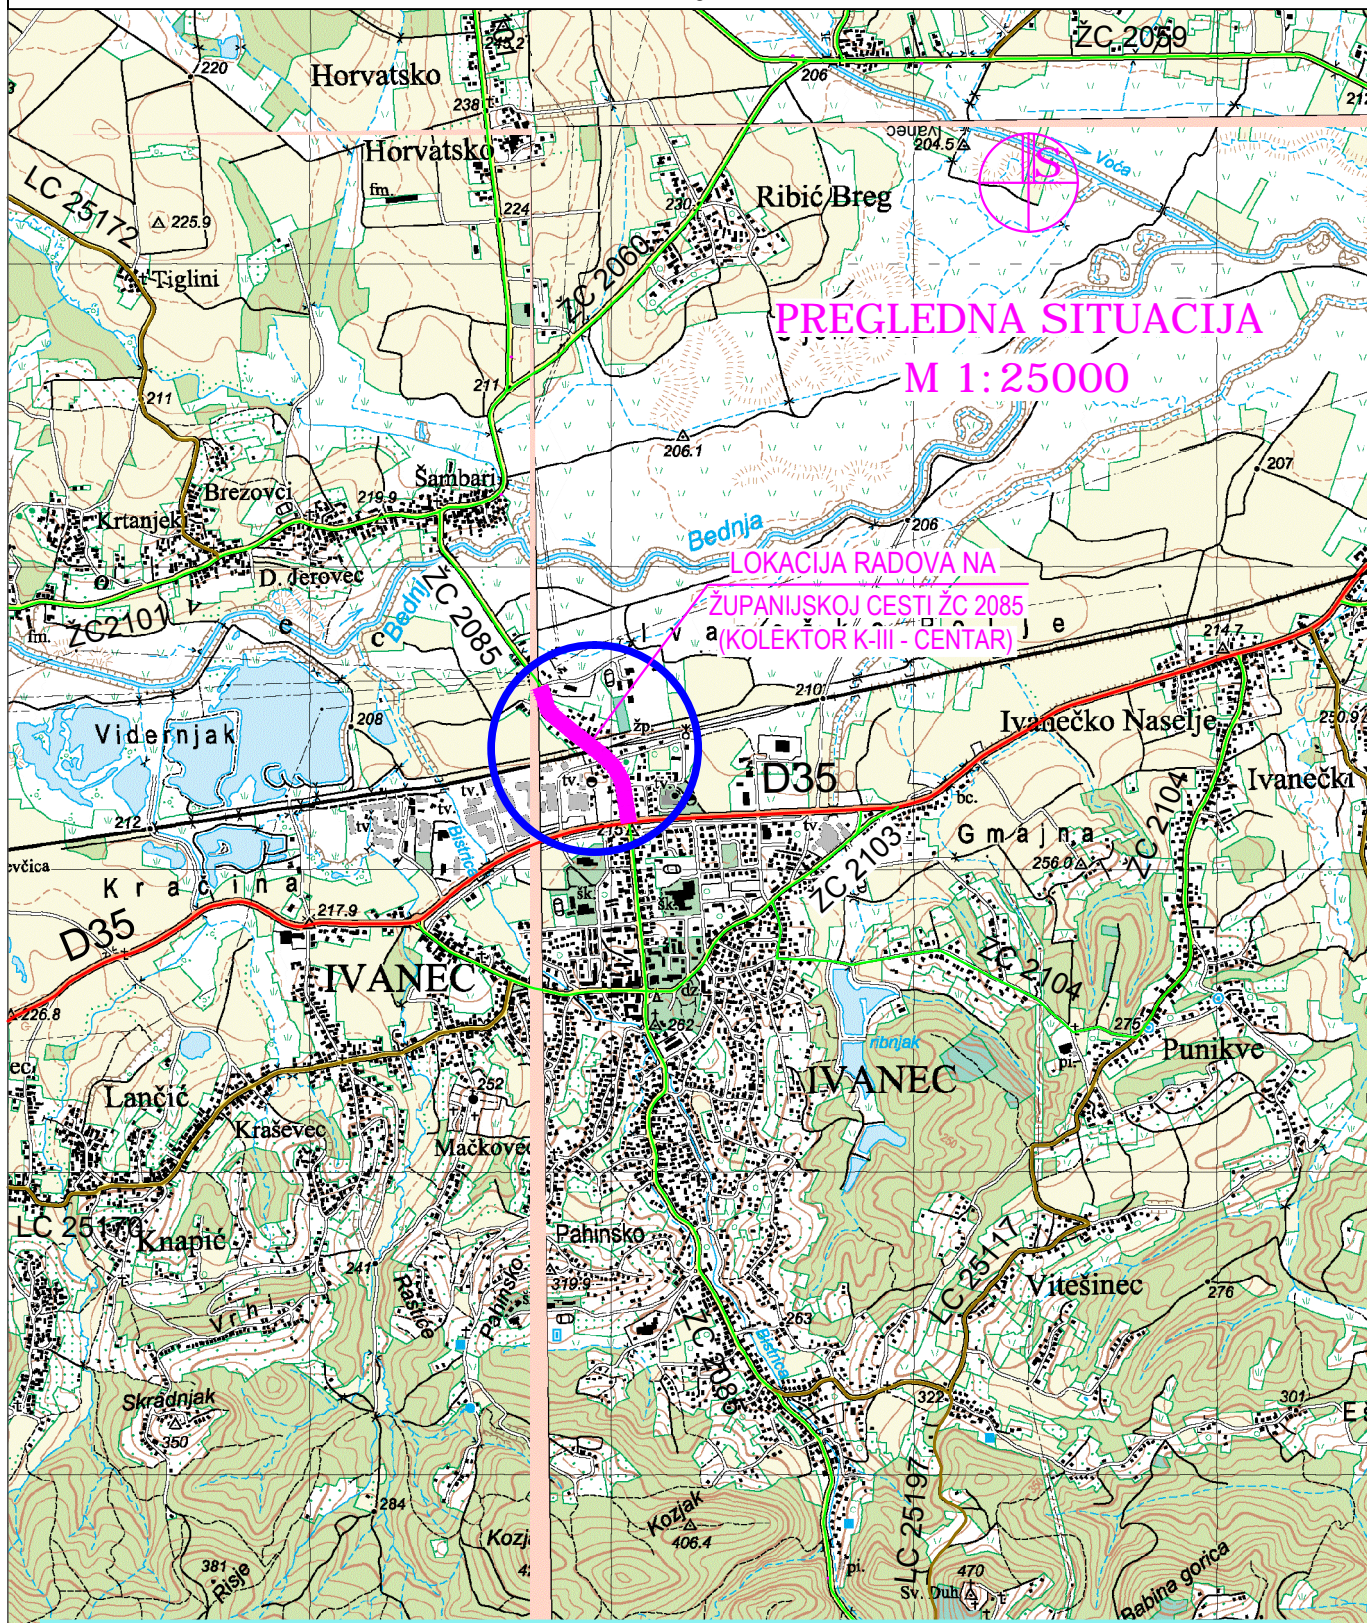

**PREGLEDNA SITUACIJA**  
**M 1:25000**

LOKACIJA RADOVA NA  
ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 2085  
(KOLEKTOR K-III - CENTAR)

**PREGLEDNA SITUACIJA M 1:25000**



Lokacija izvedbe radova na izgradnji Kolektora K-III (Etapa Centar) na županijskoj cesti ŽC 2085 u naselju Ivanec

PROJEKT IZRADIO: PRE – CON d.o.o. VARAŽDIN, Hrv. branitelja 7	Naziv: PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA ŽUPANIJSKOJ CESTI ŽC 2085 U IVANCU, PRILIKOM IZGRADNJE MJEŠOVITE KAN. MREŽE S PODRUČJA CENTRALNOG DIJELA NASELJA IVANEC (KOLEKTOR K-III)	Investitor: IVKOM - VODE d.o.o.		
	Projektant: B.PREMUŽIĆ, dipl. ing. građ.	Projekt: PROMETNI ELABORAT	Datum: 01.2024.	Oz .proj.: EL-51-7/21
			List: 3.02	

### 3.02 Shematski prikaz privremene prometne signalizacije na ŽC 2085

